


CAHIER D'ACTIVITÉS

Dossier progressif de l'opération Sillage

Format — 6 ensembles matérialisés | scénario entièrement synthétique | réponses personnelles

CAP et la ligne de vie documentaire

Contrat ou programme, Acteur, Production ou décision : chaque document conserve son statut et son historique.

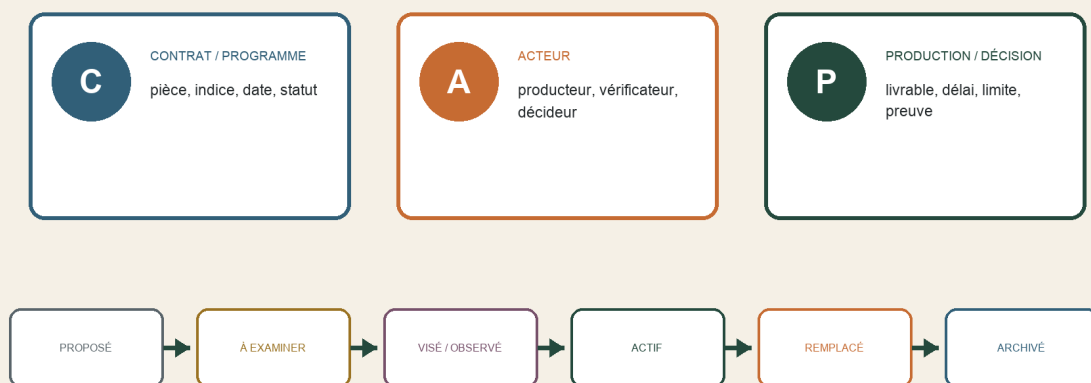

Reçu ne signifie pas actif. Visé ne signifie pas modification contractuelle.

Trois blocs CAP relient contrat ou programme, acteur et production ou décision. Une ligne de vie documentaire conserve six statuts : proposé, à examiner, visé avec observation, actif, remplacé et archivé. Le schéma rappelle que reçu ne signifie pas actif et que visé ne signifie pas modification contractuelle.

Nommer la pièce, l'acteur, la décision, l'échéance et la preuve ; ne jamais déduire une autorité du seul titre professionnel.

Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives du cahier. N'ajoutez aucune donnée personnelle, pièce réelle, norme, CCAG, contrat type ou guide protégé.

Ensemble 1 — Cartographie des missions



Six cartes distinctes : maître d'ouvrage pour programme, enveloppe, contrats, arbitrages et réception ; maître d'œuvre pour la réponse au programme et les éléments de mission confiés ; entreprise pour documents d'exécution, travaux, autocontrôles et preuves ; OPC pour tâches, enchaînements et coordination ; coordonnateur SPS pour la prévention de la coactivité ; spécialiste pour une étude, mesure ou avis ciblé. Chaque rôle doit être relié à une pièce, une phase, une autorité, une limite et une preuve.

ID	Acteur	Production / décision	Pièce	Limite
M01	MOA	fixer programme et enveloppe	programme / marché	ne pas déléguer tacitement la décision
M02	MOA	conclure les marchés publics	acte applicable	assistance ne signifie pas substitution
M03	MOE	répondre au programme	mission signée	éléments réellement confiés
M04	MOE	préparer la consultation	études approuvées	décision de l'acheteur
M05	entreprise	produire les documents d'exécution	marché / études	visa ne remplace pas l'autocontrôle
M06	MOE	examiner un document et viser	projet de référence	objet et limites du visa
M07	MOE	diriger une réunion	mission DET	pouvoirs d'ordre à vérifier

Cartes de mission M08 à M14

ID	Acteur	Production / décision	Pièce	Limite
M08	OPC	analyser le chemin critique	mission OPC	ne remplace pas DET
M09	OPC	harmoniser temps et espace	planning / interfaces	ne remplace pas SPS
M10	CSPS	prévenir la coactivité	mission SPS	ne vaut pas visa technique
M11	entreprise	annoncer l'avancement réel	situation / preuve	pourcentage seul insuffisant
M12	MOE	vérifier la situation	marché / ouvrage	ne pas conclure sans pièces
M13	MOA	décider un changement	acte et autorité	réunion seule insuffisante
M14	MOE	instruire les incidences	DÉCIDE	ne pas accepter à la place du MOA

Cartes de mission M15 à M20

ID	Acteur	Production / décision	Pièce	Limite
M15	spécialiste	répondre à une question ciblée	note / mesure	hypothèses et champ
M16	MOE	organiser les OPR	mission AOR	prépare sans réceptionner
M17	MOA	prononcer la réception	acte contradictoire	avec ou sans réserves
M18	entreprise	lever une réserve	action et preuve	réalisée ne signifie pas vérifiée
M19	MOE	suivre les réserves	registre	décision et preuve séparées
M20	exploitant	utiliser le DOE	index actif	accès et cohérence nécessaires

Choisissez quatre décisions de Sillage. Pour chacune, nommez la pièce, le producteur, le vérificateur, le décideur et la limite.

Ensemble 2 — Dossier synthétique Sillage


Programme synthétique — Maison des services fictive de 1 900 m², réhabilitation-extension en sept lots, aile est partiellement occupée. Toutes les données, entreprises et décisions sont inventées.

Repère	Zone	Signal	Dernière date utile	Action
E01	aile est occupée	programme d'usage modifié	avant études de reprise	qualifier décision et incidences
E02	façade nord	variante retenue sans synthèse complète	avant commande	compléter études et autorisations
E03	plan S-12	indices B, C et D concurrents	avant fabrication	figer pièce active et archive
E04	CR-07	décision attribuée au mauvais acteur	avant exécution	rectifier et obtenir la décision
E05	interface D2	façade et réseau désynchronisés	avant fermeture	synthèse, visa et séquence
E06	situation façade	70 % financier / 50 % posé	avant acompte	rapprocher postes et preuves
E07	équipement compact	changement proposé oralement	avant commande	instruire DÉCIDE
E08	dossier de réception	réserves non localisées et trois DOE	avant décision	classer, localiser et vérifier

ID	Document	Indice	Statut	Auteur	Usage
DOC-01	programme Sillage	P2	actif fictif	MOA	référence du besoin
DOC-02	projet façade	P-07	base consultation	MOE	base de comparaison
DOC-03	variante façade	V-02	retenue fictive	MOA	compléments requis
DOC-04	plan façade S-12	B	marché	entreprise	indice initial
DOC-05	plan façade S-12	C	visé avec observation	entreprise	interface D2 ouverte
DOC-06	plan façade S-12	D	proposé	entreprise	décision absente

Construisez le témoin de base de la façade : programme, projet, variante, marché, plans actifs, décision et versions remplacées.

Ensemble 3 — Matrice CAP et journal DÉCIDE

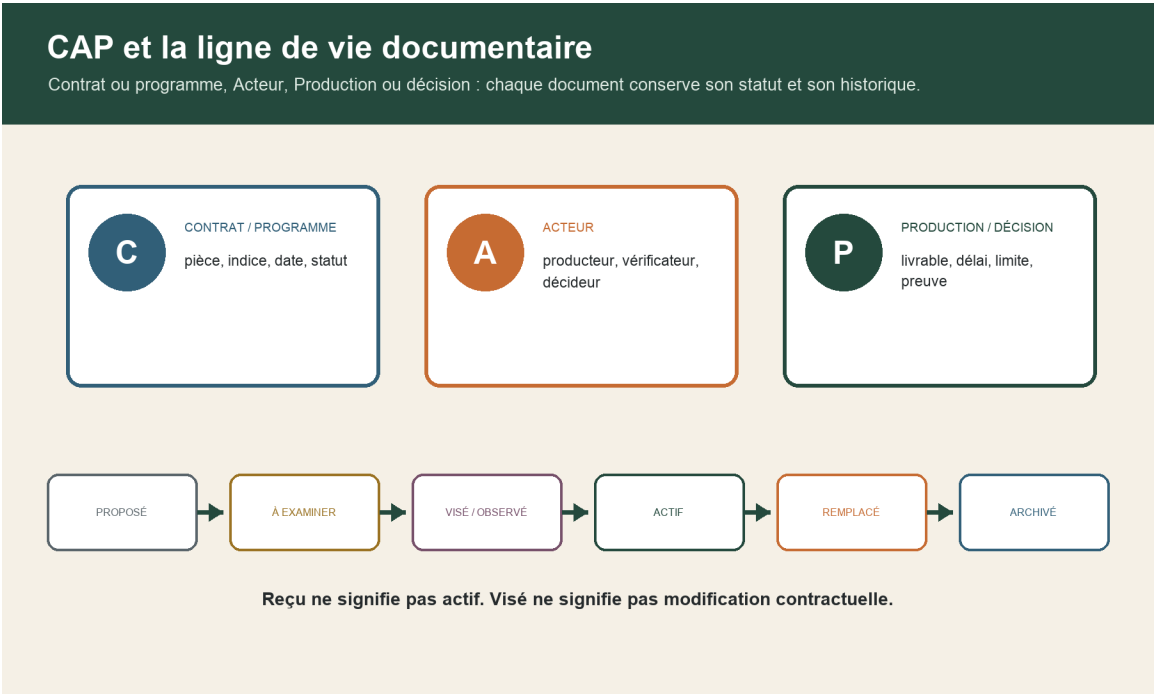

Trois blocs CAP relient contrat ou programme, acteur et production ou décision. Une ligne de vie documentaire conserve six statuts : proposé, à examiner, visé avec observation, actif, remplacé et archivé. Le schéma rappelle que reçu ne signifie pas actif et que visé ne signifie pas modification contractuelle.

ID	Contrat / programme	Acteur	Production / décision	Échéance	Preuve
CAP-01	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-02	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-03	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-04	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-05	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-06	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-07	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-08	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-09	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-10	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver

Matrice CAP — lignes 11 à 20

ID	Contrat / programme	Acteur	Production / décision	Échéance	Preuve
CAP-11	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-12	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-13	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-14	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-15	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-16	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-17	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-18	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-19	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver
CAP-20	à identifier	à attribuer	à produire ou décider	à dater	à prouver

Repère	Étape	Contenu attendu
D	Demande	auteur, objet, motif et urgence revendiquée
É	État de référence	programme, marché, plans et décision actifs
C	Chiffrage et incidences	qualité, coût, délai, sécurité, exploitation et autorisation
I	Instruction	études, avis, options et contradiction
D	Décision	acteur autorisé, choix, conditions et date d'effet
E	Évidence	pièces modifiées, diffusion, exécution et vérification

Journal DÉCIDE — huit lignes

ID	Demande	État de référence	Incidences	Instruction	Décision	Évidence
DEC-01	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver
DEC-02	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver

ID	Demande	État de référence	Incidences	Instruction	Décision	Évidence
DEC-03	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver
DEC-04	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver
DEC-05	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver
DEC-06	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver
DEC-07	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver
DEC-08	à qualifier	à fixer	à chiffrer	à attribuer	à tracer	à prouver

Complétez CAP pour E01 à E04 et DÉCIDE pour la variante E02 sans attribuer de pouvoir implicite.

Ensemble 4 — Visa, réunion et actions

Document	Indice	Projet comparé	Statut	Observation	Suite
S-12	C	P-07 / V-02	suspendu	interface D2	synthèse puis réémission
R-08	B	P-07	à examiner	descente ancienne	coordination façade-réseau
F-EQ-03	A	marché équipement	proposé	modèle compact	DÉCIDE avant commande


ID	Fait	Décision	Action	Échéance	Preuve
E01	aile est occupée	programme d'usage modifié	acteur à confirmer	avant études de reprise	preuve à définir
E02	façade nord	variante retenue sans synthèse complète	acteur à confirmer	avant commande	preuve à définir
E03	plan S-12	indices B, C et D concurrents	acteur à confirmer	avant fabrication	preuve à définir
E04	CR-07	décision attribuée au mauvais acteur	acteur à confirmer	avant exécution	preuve à définir

Actions E05 à E08

ID	Fait	Décision	Action	Échéance	Preuve
E05	interface D2	façade et réseau désynchronisés	acteur à confirmer	avant fermeture	preuve à définir
E06	situation façade	70 % financier / 50 % posé	acteur à confirmer	avant acompte	preuve à définir
E07	équipement compact	changement proposé oralement	acteur à confirmer	avant commande	preuve à définir
E08	dossier de réception	réserves non localisées et trois DOE	acteur à confirmer	avant décision	preuve à définir

Réécrivez CR-07 en distinguant fait, avis, décision attendue, action, responsable, échéance et preuve de fermeture.


Ensemble 5 — Cockpit QCD+ et changements

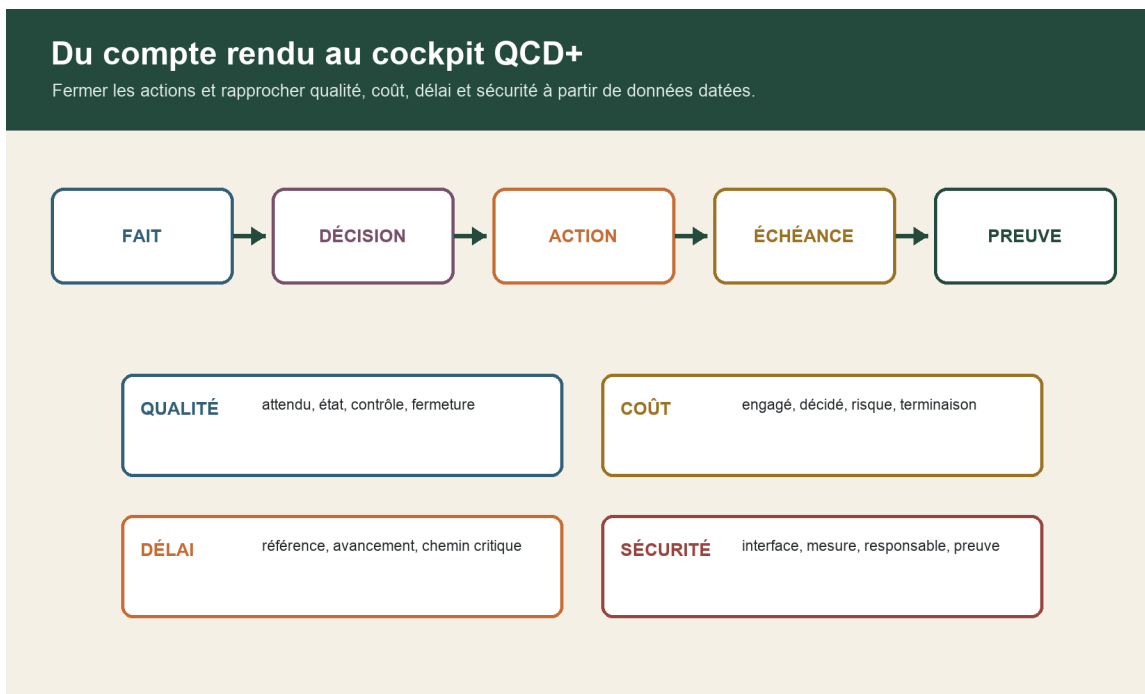

Une chaîne en cinq étapes relie fait, décision, action, échéance et preuve. Quatre cadrans rapprochent qualité, coût, délai et sécurité : attendu et contrôle ; engagé et prévision ; référence et chemin critique ; interface, mesure et preuve.

Repère	Cadran	Données à rapprocher	Sortie
Q	qualité	attendu / état / contrôle	preuve et fermeture
C	coût	engagé / décidé / risque	situation et terminaison
D	délai	référence / prévision	chemin critique et marge
+	sécurité	interface / coactivité	mesure, responsable et preuve

Lot	Avancement financier	Avancement physique	Document	Décision / contrôle
façade	70 % fictif	50 % posé	S-12 C suspendu sur D2	rapprocher postes et zones
réseaux	52 % fictif	55 % posé	R-08 B	synthèse avec façade
équipement	0 %	non commandé	F-EQ-03 A proposé	DÉCIDE avant engagement

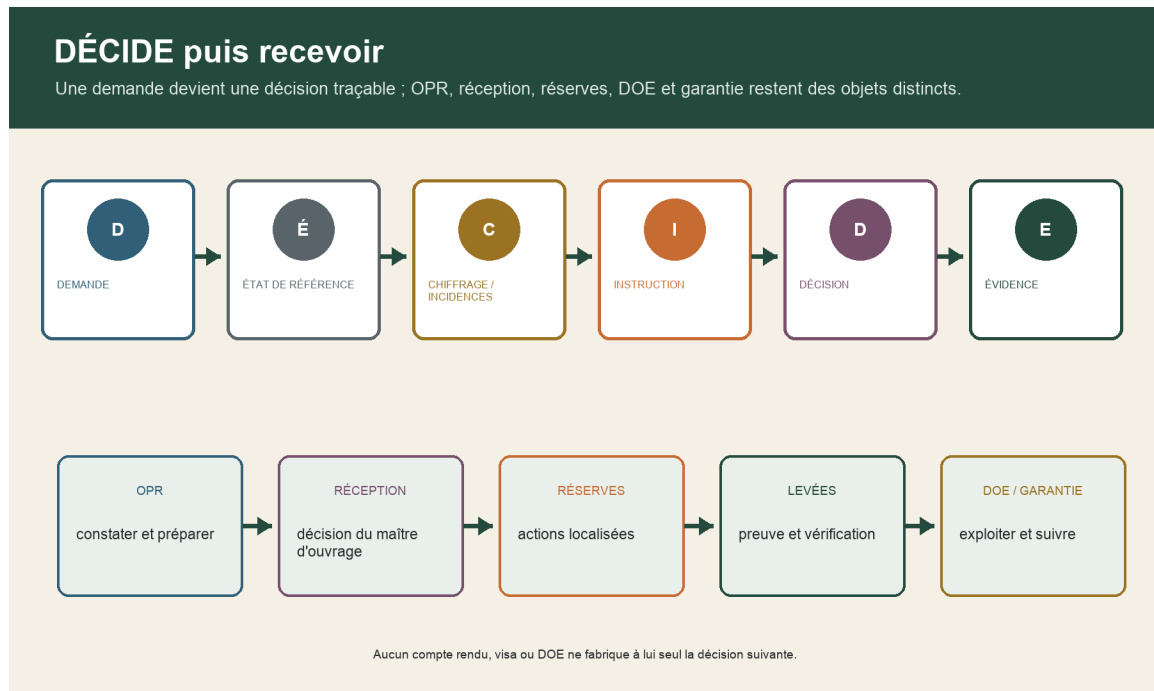

Le journal DÉCIDE enchaîne demande, état de référence, chiffrage et incidences, instruction, décision et évidence. Le passeport de réception sépare opérations préalables, décision de réception, réserves, levées, DOE et garantie.

Instruisez E06 et E07 : données sources, chemin critique, incidences, acteur de décision et preuve attendue.

Ensemble 6 — Réception, DOE et garantie

Objet	Auteur / décideur	Question	Preuve
OPR	MOE selon mission	quels constats préparer ?	liste localisée et contradictoire
réception	maître d'ouvrage	accepter avec ou sans réserves ?	acte de réception
réserve	acte puis entreprise	quelle action localisée ?	preuve de réalisation
levée	circuit prévu	l'action est-elle vérifiée ?	constat relié à la réserve
DOE	producteurs puis contrôleurs	l'exploitation retrouve-t-elle l'état exécuté ?	index actif et cohérent
garantie	entrepreneur et acteurs du suivi	quel désordre a été signalé ?	notification, action et preuve

Produisez le carnet final : mission, documents, visas, huit actions, QCD+, changements, OPR, réception, réserves, DOE, garantie et deux relais.

Accessibilité — Les quatre schémas possèdent une alternative textuelle. Les acteurs, statuts, délais et décisions sont écrits ; la couleur n'est jamais le seul vecteur.
